



VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Yhteenvetotietoja valtion toiminnan ja ICT:n kehittämisen hankesalkusta

Tilanne 05/2016



JulkICT-osasto

Yhteiset periaatteet valtionhallinnon merkittävien ICT:n kehittämistä sisältävien hankkeiden seurannassa ja raportoinnissa

(VM:n ohje VM/1393/00.00.00/2014)

Merkittävä hanke =
Kehittämisen aikaiset
kokonaiskustannukset
vähintään 1 milj. €

Yhteenvedon käsittely tietohallinnon
kehittämisen- ja koordinaatioryhmässä
(TIETOKEKO) sekä tarvittaessa
kansliapäällikkökokouksessa

VM:n JulkICT-toiminto tekee säännöllisesti yhteenvedon

- Perustiedot hankesalkkujärjestelmään
- Hankesuunnitelma
- Kustannus-hyötyanalyysi, hankearviointi ja tietohallintolain mukainen VM:n lausunto (jos tarpeen)

Tilanneraportti hankesalkkujärjestelmässä säännöllisesti vähintään 3 krt/v (*) (tai useammin; osa hankkeen normaalia seuranta)

Hankkeen päättymisen jälkeen selvitys saavutetuista hyödyistä

Hankkeen valmistelu

Hankkeen toteutus

Hyötyjen todentaminen

Hankkeesta vastaava ministeriö / virasto

- *) 1. vuodenvaihteessa tammikuussa (vuoden lopun tilanne)
2. keväällä toukokuussa (huhtikuun lopun tilanne)
3. syksyllä syyskuussa (elokuun lopun tilanne)

Valtion toiminnan ja ICT:n kehittämisen hankesalkun yleistilanne

(kokonaiskustannuksiltaan yli 1 milj. € hankkeet, tilanne 05/2016)

- Esisuunnittelu-/suunnitteluvaiheessa yhteensä 35 hanketta
- Toteutus- tai päättämisvaiheessa yhteensä 106 hanketta, joiden liikennevaloseuranta näyttää kokonaisuudessaan seuraavalta


	Aikataulu	Kustannukset	Tuotosten laatu	Tuotosten laajuus	Henkilöstö	Riskit	Hyödyt
Suunniteltu	63 %	81 %	82 %	81 %	74 %	51 %	93 %
Poikkeama	29 %	17 %	18 %	17 %	21 %	44 %	6 %
Ongelma	8 %	2 %	0 %	2 %	5 %	5 %	1 %

- TIETOKEKO-ryhmälle tehdyssä yhteenvedossa nostettu liikennevaloseurannan perusteella esille 28 hanketta, jotka näyttäisivät vaativan erityishuomiota
- Hyötyjen jälkiseurantaan merkitty yhteensä 23 hanketta
 - Hyötyjen seurantatietoja kootaan ensimmäisen kerran seuraavalla yhteisellä raportointikierroksella syyskuussa

Tietoja valtion toiminnan ja ICT:n kehittämisen hankesalkusta

(mukana kokonaiskustannuksiltaan yli 1 milj. € hankkeet, tilanne 05/2016)

Toteutus- ja päättämisvaiheissa olevien hankkeiden jakautuminen eri hallinnonaloille

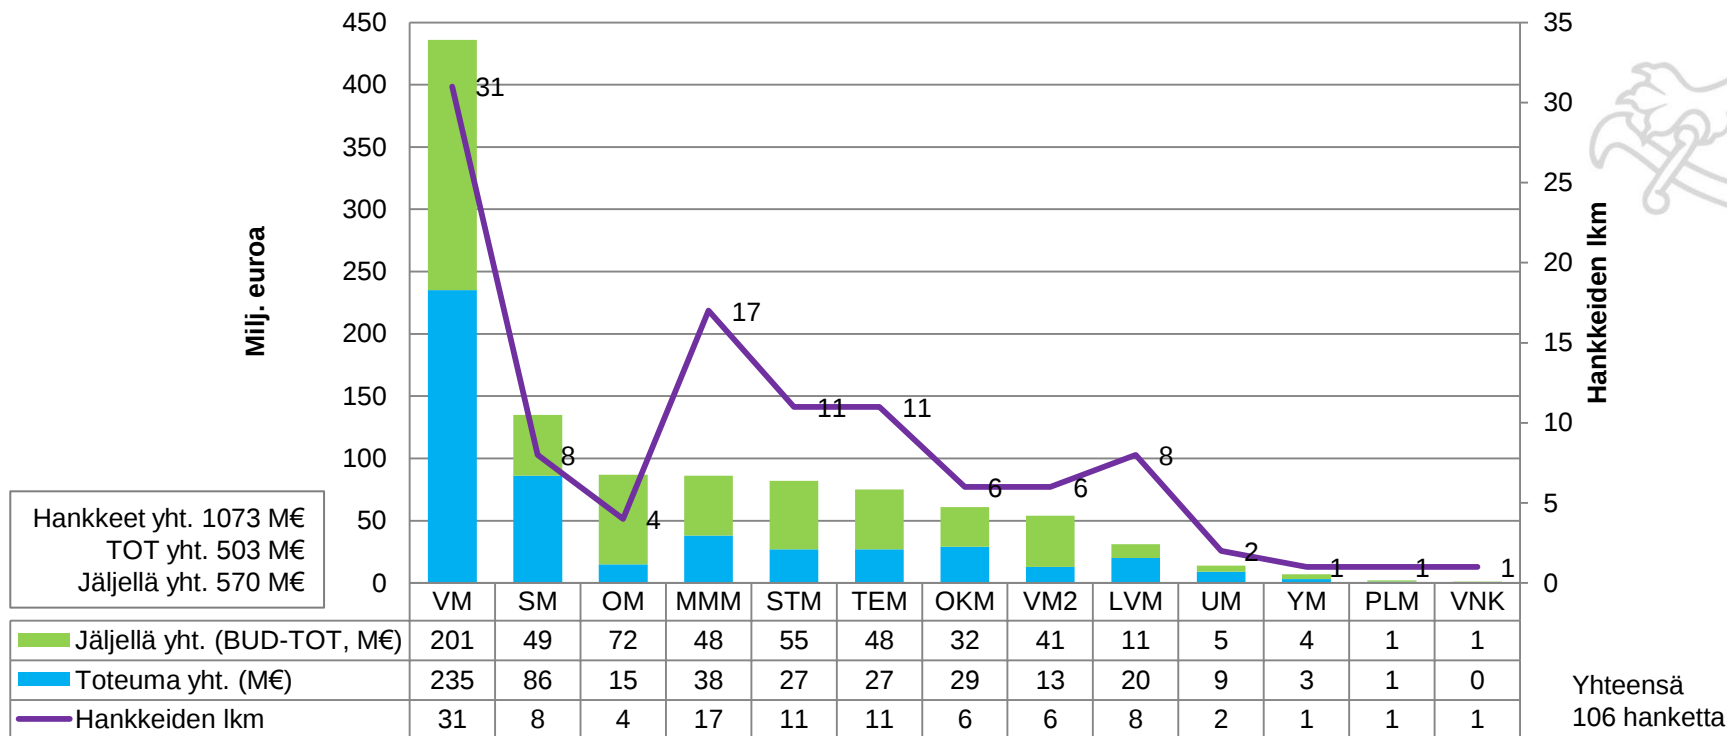

VM = valtiovarainministeriön hallinnonala ilman JulkICT-osaston vastuulla olevia hankkeita

VM2 = valtiovarainministeriön JulkICT-osaston vastuulla olevat hankkeet (erityisesti kansallinen palveluarkkitehtuuri, KaPA-ohjelma)



VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Liite

- Yhteenvedon liitteenä on excel-taulukko, josta hankkeet löytyvät eri välilehdiltä vaiheiden mukaan jaoteltuna

Esisuunnittelu ja suunnittelu

Toteutus ja päättäminen

Hyötyjen jälkiseuranta

Lisätietoja tarvittaessa

Valtiovarainministeriö

JulkICT-osasto

Neuvotteleva virkamies Toni Äikäs

etunimi.sukunimi@vm.fi

